

TP1:SE
Inicio: 15/9/25
Fin: 5/2/26
Duración: 104

ENTREGA 1 SEMAN...
Inicio: 19/9/25
Fin: 19/9/25
Duración: 0

ENTREGA 2 SEMAN...
Inicio: 26/9/25
Fin: 26/9/25
Duración: 0


Documentación es...
Inicio: 29/9/25
Fin: 16/10/25
Duración: 14


Documentación es...
Inicio: 29/9/25
Fin: 16/10/25
Duración: 14

Documentación es...
Inicio: 29/9/25
Fin: 16/10/25
Duración: 14

Documentación es...
Inicio: 29/9/25
Fin: 16/10/25
Duración: 14

ENTREGA 3 SEMAN...
Inicio: 3/10/25
Fin: 3/10/25
Duración: 0

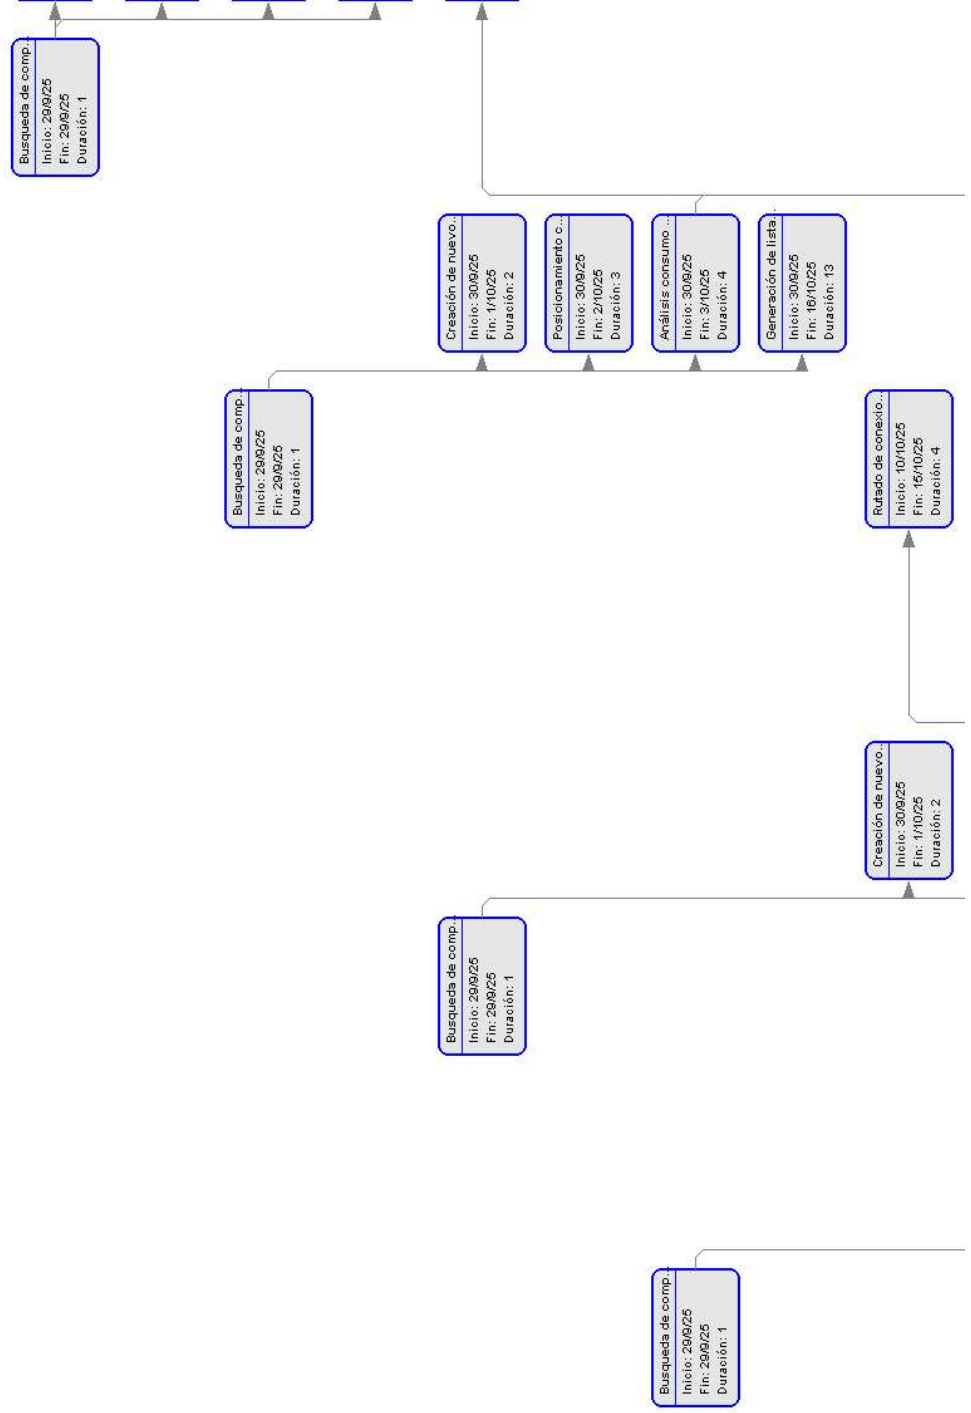

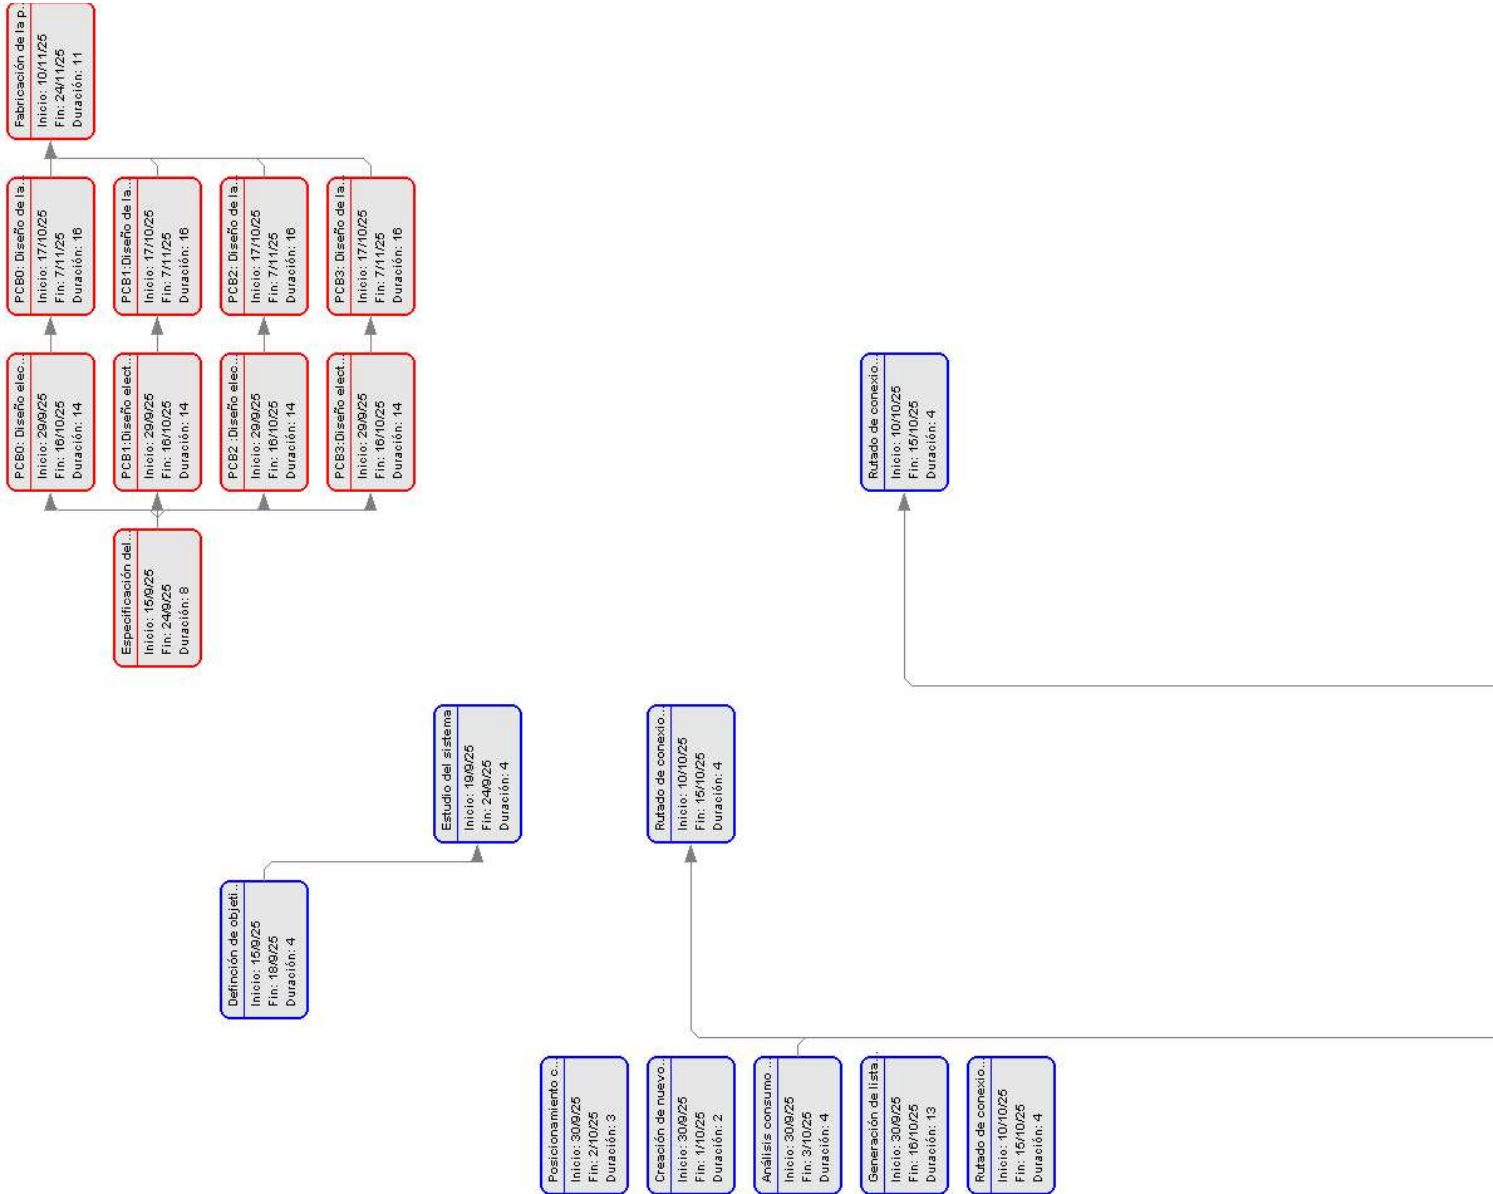

ENTREGA 4 SEMANA
Inicio: 10/10/25
Fin: 10/10/25
Duración: 0

ENTREGA 5 SEMANA
Inicio: 17/10/25
Fin: 17/10/25
Duración: 0

Creación de huella
Inicio: 17/10/25
Fin: 23/10/25
Duración: 5

Documentación: se
Inicio: 17/10/25
Fin: 01/11/25
Duración: 15

Creación de huella
Inicio: 17/10/25
Fin: 23/10/25
Duración: 5

Documentación: se
Inicio: 17/10/25
Fin: 01/11/25
Duración: 15

Creación de huella
Inicio: 17/10/25
Fin: 23/10/25
Duración: 5

Documentación: se
Inicio: 17/10/25
Fin: 01/11/25
Duración: 15


Definición de borde
Inicio: 17/10/25
Fin: 23/10/25
Duración: 5

Posicionado de co...
Inicio: 17/10/25
Fin: 23/10/25
Duración: 5

Definición de borde
Inicio: 17/10/25
Fin: 23/10/25
Duración: 5


Planos de masa y o...
Inicio: 24/10/25
Fin: 28/10/25
Duración: 3

Rutado de conexión...
Inicio: 24/10/25
Fin: 30/10/25
Duración: 5

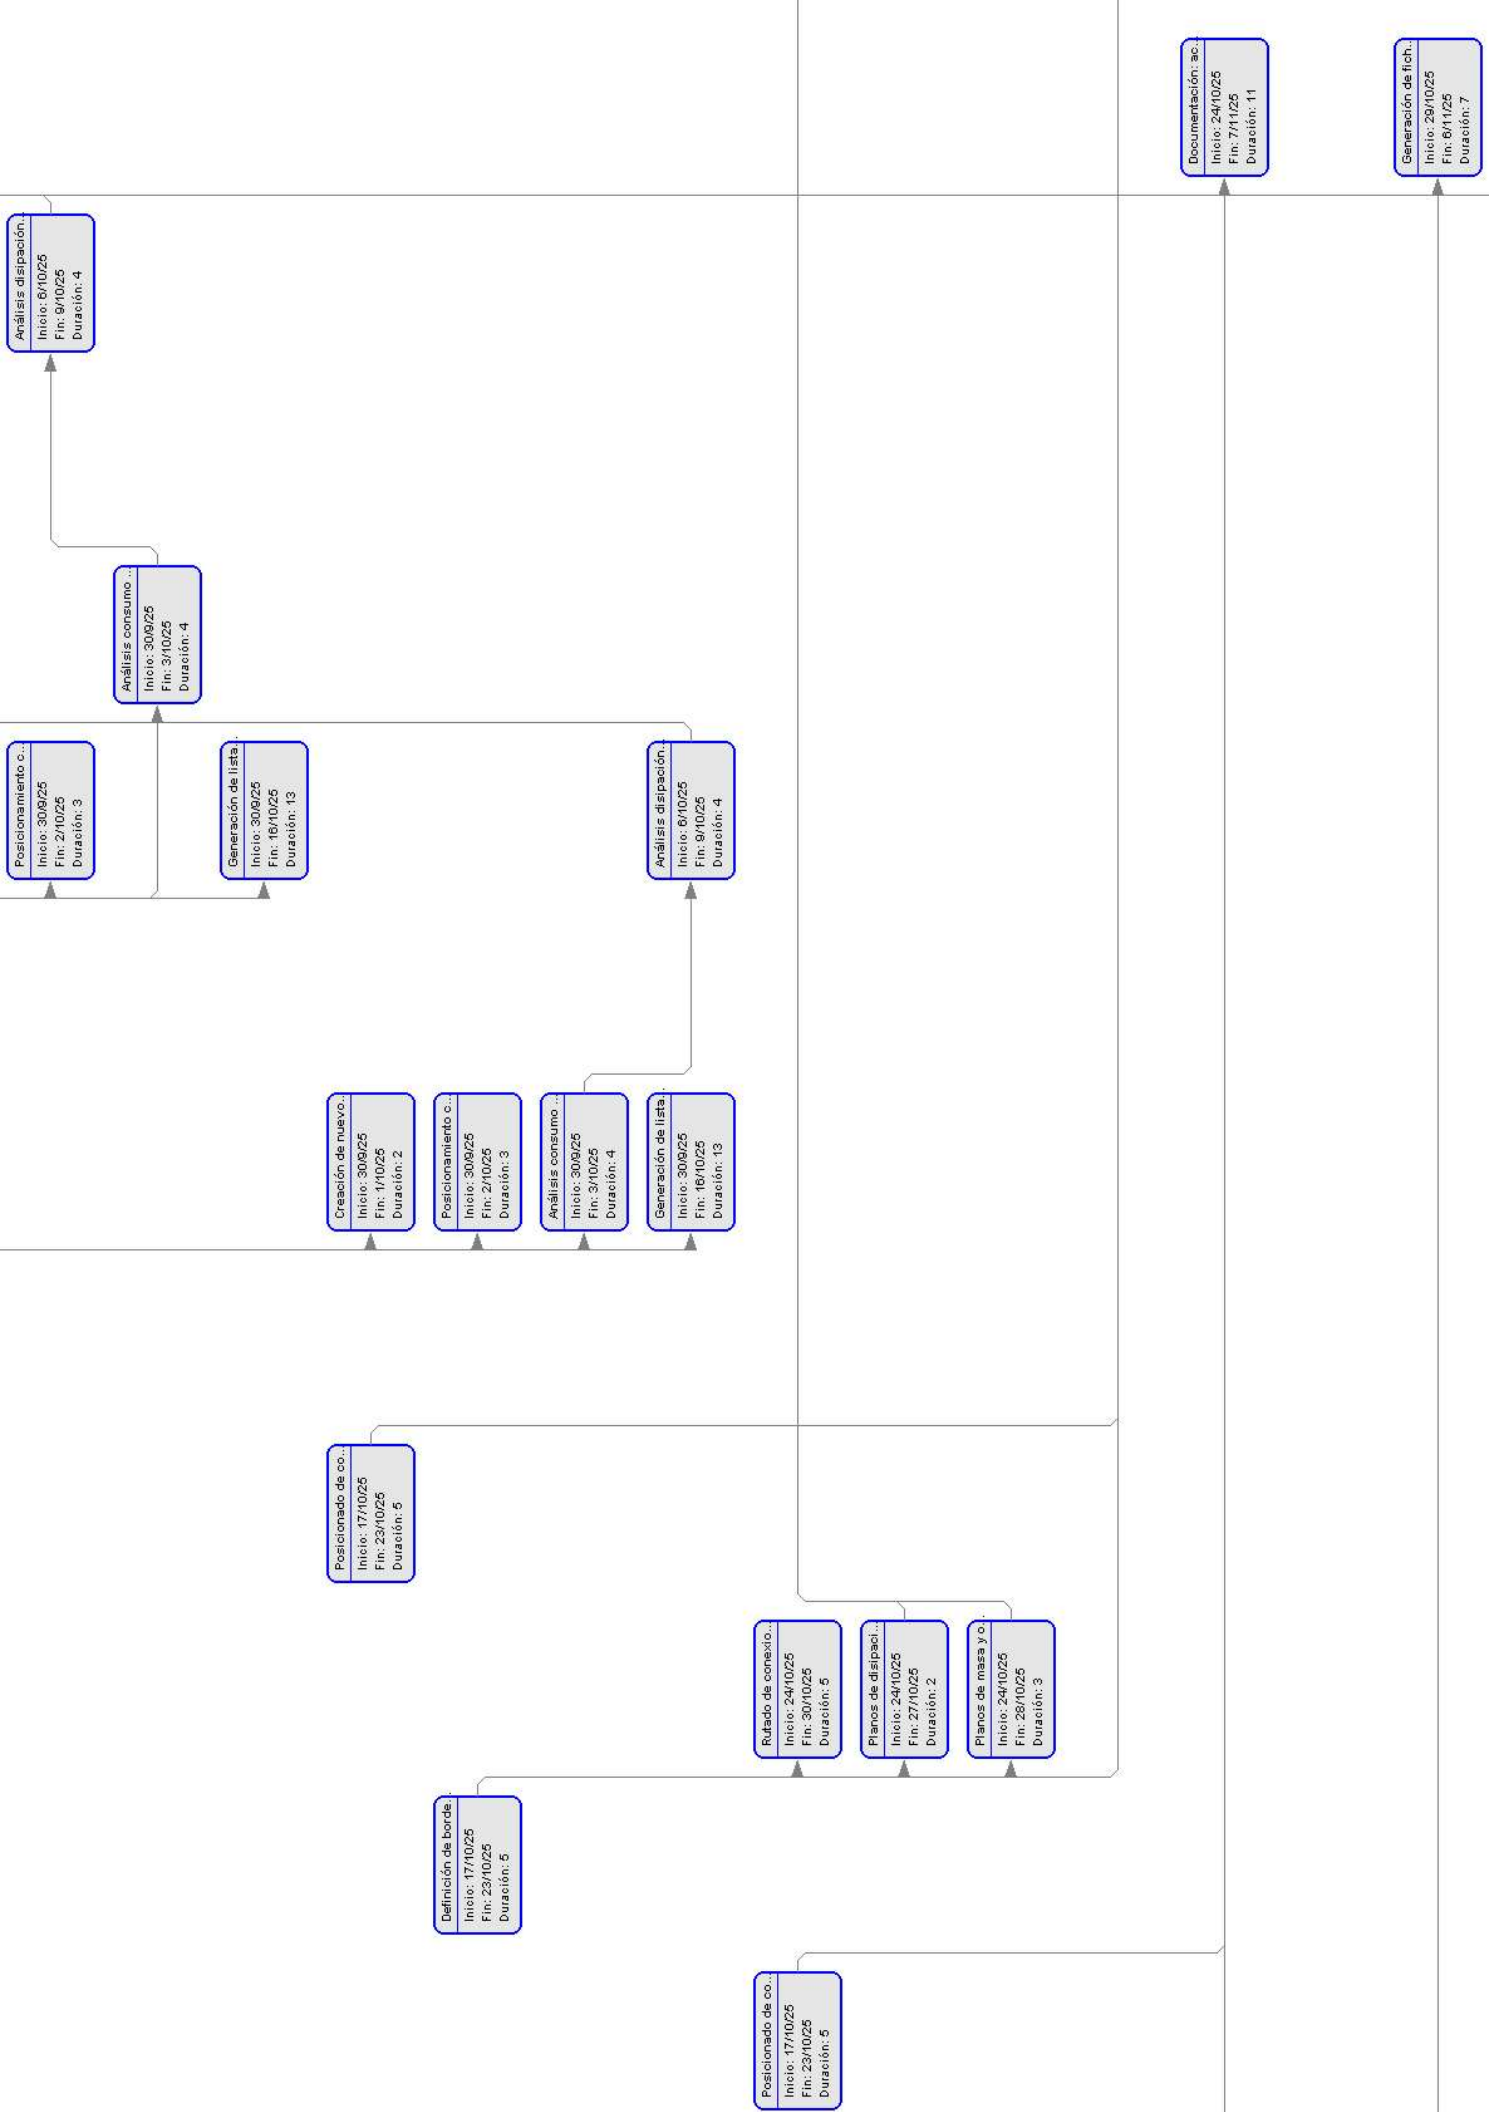

Generación de fich.
Inicio: 28/10/25
Fin: 6/11/25
Duración: 7

Documentación: ac.
Inicio: 24/10/25
Fin: 7/11/25
Duración: 11

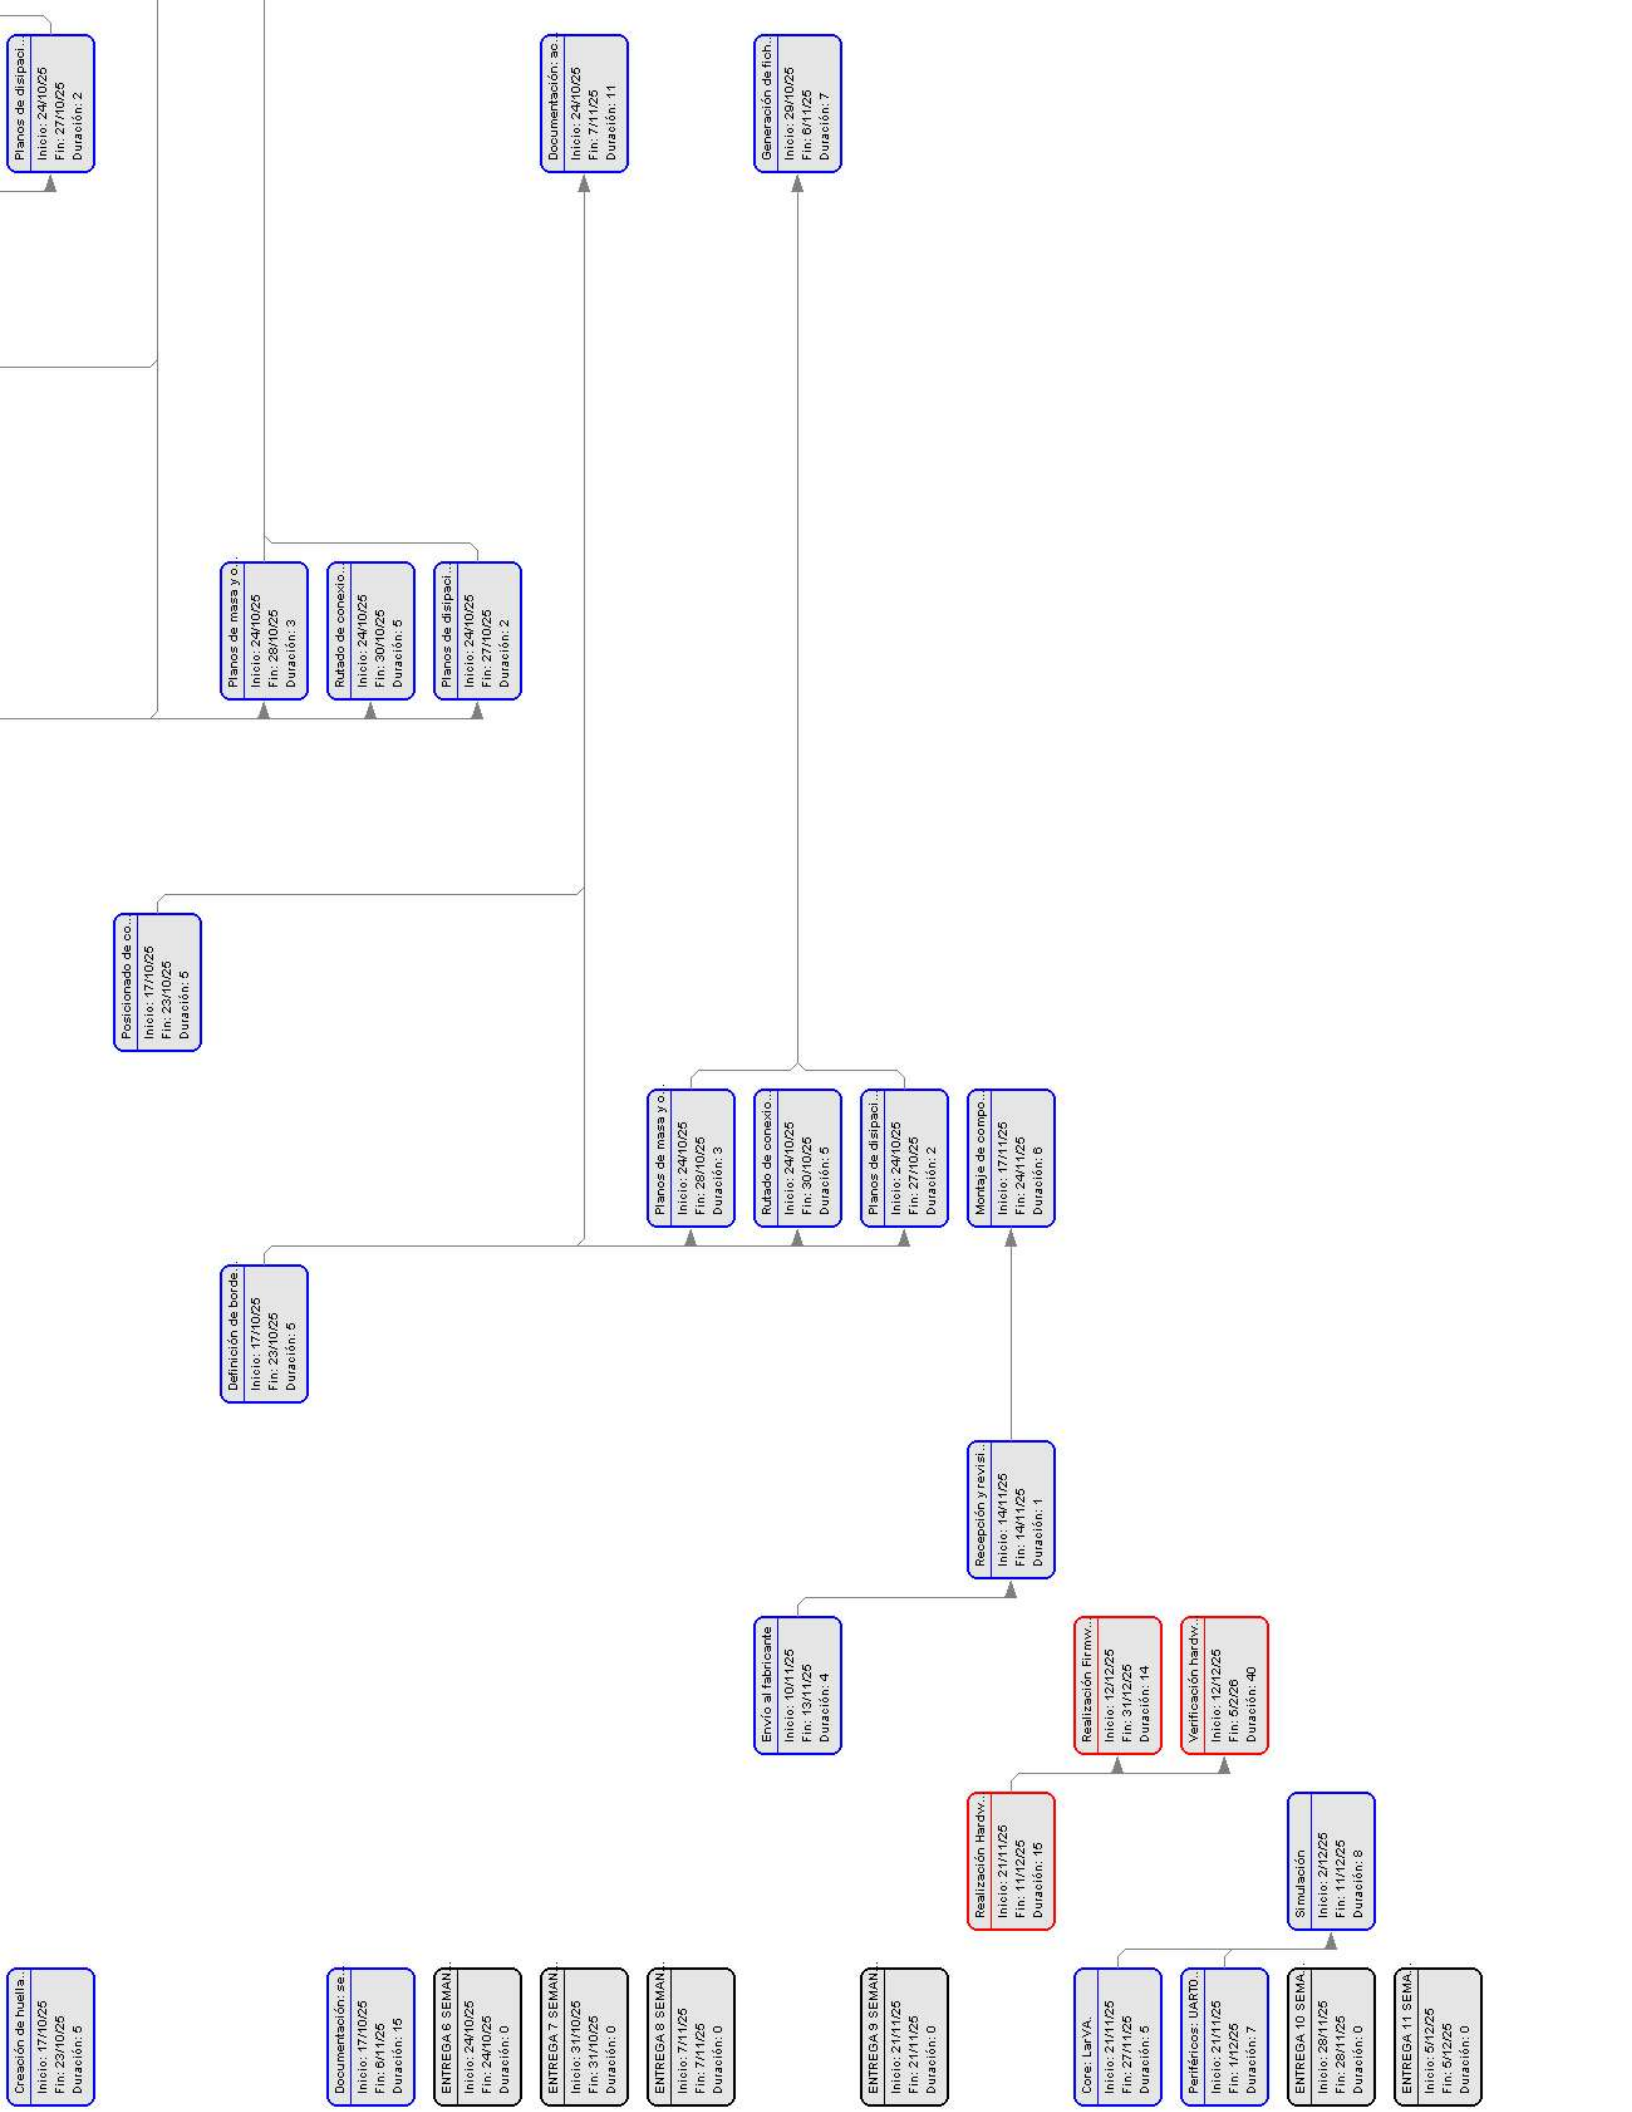

Documentación ac.
Inicio: 24/10/25
Fin: 7/11/25
Duración: 11

Generación de fich.
Inicio: 20/10/25
Fin: 6/11/25
Duración: 7



Análisis de dispersión.
Inicio: 6/10/25
Fin: 9/10/25
Duración: 4

Análisis de dispersión.
Inicio: 6/10/25
Fin: 9/10/25
Duración: 4

Control de element...	Inicio: 12/12/25 Fin: 31/12/25 Duración: 14
Verificación	Inicio: 12/12/25 Fin: 31/12/25 Duración: 14
Programa principa...	Inicio: 12/12/25 Fin: 31/12/25 Duración: 14
Documentación firm...	Inicio: 12/12/25 Fin: 31/12/25 Duración: 14
Verificación inicial	Inicio: 12/12/25 Fin: 8/1/26 Duración: 20
Verificación firmwa...	Inicio: 12/12/25 Fin: 8/1/26 Duración: 20
Resolución de prob...	Inicio: 12/12/25 Fin: 8/1/26 Duración: 20
Análisis de prestac...	Inicio: 12/12/25 Fin: 8/1/26 Duración: 20
Montaje final - Plect...	Inicio: 7/1/26 Fin: 20/1/26 Duración: 10
Pruebas de campo	Inicio: 20/1/26 Fin: 5/2/26 Duración: 13
ENTREGA 12 SEMA...	Inicio: 12/12/25 Fin: 12/12/25 Duración: 0
ENTREGA 13 SEMA...	Inicio: 19/12/25 Fin: 19/12/25 Duración: 0
ENTREGA 14 SEMA...	Inicio: 9/1/26 Fin: 9/1/26 Duración: 0
ENTREGA 15 SEMA...	Inicio: 16/1/26 Fin: 16/1/26 Duración: 0

ENTREGA 16 SEMA
Inicio: 21/1/26
Fin: 21/1/26
Duración: 0

Documentación
Inicio: 19/6/25
Fin: 5/2/26
Duración: 100

Realización informe
Inicio: 19/6/25
Fin: 5/2/26
Duración: 100

ENTREGA FINAL
Inicio: 5/2/26
Fin: 5/2/26
Duración: 0

